


Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	Месяцы						
										Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
1		Окончание строительства жилого дома в МО ГО Печора ул.Ленинградская 4. (площадь 867,5 м.кв, квартир 15)		0	3 685,8 ч	0	184 дней	Пн 11.01.16	Вт 12.07.16							
2		1. Крыльца		0	33,02 ч	0	5 дней	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16							
3		Устройство металлических ограждений	100м	0,03	1,25 ч	2	1 день	Пн 16.05.16	Пн 16.05.16							
4		Очистка поверх.щётками	м2	17,75	15,98 ч	2	1 день	Вт 17.05.16	Вт 17.05.16							
5		Окраска ограждений	100м2	0,18	12,62 ч	2	1 день	Ср 18.05.16	Ср 18.05.16							
6		Устройство обрешётки из досок	100м2	0,05	1,5 ч	2	1 день	Чт 19.05.16	Чт 19.05.16							
7		Монтаж кровельного покрытия профлист	100м2	0,05	1,67 ч	2	1 день	Пт 20.05.16	Пт 20.05.16							
8		2. Перекрытие техподполья		0	850 ч	0	8 дней	Ср 01.06.16	Пт 10.06.16							
9		Изоляция перекрытия	1м3	80,34	850 ч	5	8 дней	Ср 01.06.16	Пт 10.06.16							
10		3. Чердачное перекрытие		0	883,02 ч	0	28 дней	Пн 11.01.16	Ср 17.02.16							
11		Снятие пароизоляции	100м2	1,61	7,57 ч	1	1 день	Пн 11.01.16	Пн 11.01.16							
12		Разборка тепловой изоляции из плит	100м2	3,21	42,73 ч	4	2 дней	Вт 12.01.16	Ср 13.01.16							
13		Устройство пароизоляции	100м2	3,21	25,18 ч	2	2 дней	Чт 14.01.16	Пт 15.01.16							
14		Изоляция покрытия и перекрытия	1м3	44,99	476 ч	5	12 дней	Пн 18.01.16	Вт 02.02.16							
15		Изоляции покрытия и перекрытия	1м3	12,85	136 ч	5	4 дней	Ср 03.02.16	Пн 08.02.16							
16		Устройство выравнивающих стяжек 15мм	100м2	3,21	87,47 ч	5	2 дней	Вт 09.02.16	Ср 10.02.16							
17		Устройство выравнивающих стяжек 1мм	100м2	3,21	80,33 ч	5	2 дней	Чт 11.02.16	Пт 12.02.16							
18		Устройство пароизоляции	100м2	3,48	27,28 ч	2	2 дней	Пн 15.02.16	Вт 16.02.16							
19		Установка закладных деталей весом до 4кг	1т	0	0,43 ч	1	1 день	Ср 17.02.16	Ср 17.02.16							
20		4. Полы		0	834,22 ч	0	27 дней	Пн 11.01.16	Вт 16.02.16							
21		Разборка покрытий полов из линолеума	100м2	7,05	80,3 ч	4	3 дней	Пн 11.01.16	Ср 13.01.16							
22		Разборка плинтусов деревянных	100м	2,4	9,05 ч	2	1 день	Чт 14.01.16	Чт 14.01.16							
23		Разборка стяжек 20мм	100м2	4,23	140 ч	4	4 дней	Пт 15.01.16	Ср 20.01.16							
24		Устройство стяжек 15мм	100м2	7,05	252 ч	4	7 дней	Чт 21.01.16	Пт 29.01.16							
25		Устройство линолеума	100м2	7,05	298,92 ч	4	10 дней	Пн 01.02.16	Пт 12.02.16							
26		Устройство плинтуса	100м	8,1	53,95 ч	4	2 дней	Пн 15.02.16	Вт 16.02.16							
27		5. Кровля		0	41,63 ч	0	3 дней	Пн 30.05.16	Ср 01.06.16							
28		Огнебиозащитное покрытие дерев.констр	100м2	3,2	28,38 ч	3	2 дней	Пн 30.05.16	Вт 31.05.16							
29		Устройство слуховых окон	1	2	13,27 ч	2	1 день	Ср 01.06.16	Ср 01.06.16							
30		7. Окна, двери		0	35,63 ч	0	3 дней	Ср 27.01.16	Пт 29.01.16							
31		Регулировка оконной фурнитуры	100шт	0,57	14,02 ч	2	1 день	Ср 27.01.16	Ср 27.01.16							
32		Регулировка дверной фурнитуры	100шт	0,66	21,62 ч	2	2 дней	Чт 28.01.16	Пт 29.01.16							
33		8. Электромонтажные работы		0	87,63 ч	0	8 дней	Пн 18.01.16	Ср 27.01.16							
34		Электроплита	1	15	35,85 ч	4	1 день	Пн 18.01.16	Пн 18.01.16							
35		Розетка штепсельная	100шт	0,15	5,72 ч	1	1 день	Вт 19.01.16	Вт 19.01.16							
36		Счётчики	1	15	5,1 ч	1	1 день	Ср 20.01.16	Ср 20.01.16							
37		Звонок электрический с кнопкой	100комг	0,15	11,48 ч	2	1 день	Чт 21.01.16	Чт 21.01.16							
38		Провод	100м	1,02	20,6 ч	2	1 день	Пт 22.01.16	Пт 22.01.16							
39		Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50x5мм	10шт	0,3	3,22 ч	1	1 день	Пн 25.01.16	Пн 25.01.16							
40		Заземлитель горизонтальный из полосы	100м	0,1	1,67 ч	1	1 день	Вт 26.01.16	Вт 26.01.16							
41		Проводник заземляющ.открыто	100м	0,2	4,02 ч	1	1 день	Ср 27.01.16	Ср 27.01.16							

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "РК Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____

Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб	Длительность	Начало	Окончание															
										Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль							
42		9. Техподполье (летний период)		0	920,63 ч	0	30 дней	Ср 01.06.16	Вт 12.07.16															
43		Устройство бетона	1м3	24,32	89,02 ч	7	2 дней	Ср 01.06.16	Чт 02.06.16															
44		Устройство стяжек	100м2	3,04	126,2 ч	7	1 день	Пт 03.06.16	Пт 03.06.16															
45		Устройство оклеечной рулон.первый слой	100м2	3,04	140,38 ч	4	2 дней	Пн 06.06.16	Вт 07.06.16															
46		Устройство оклеечной рулон.послед.слой	100м2	3,04	84,68 ч	4	2 дней	Ср 08.06.16	Чт 09.06.16															
47		Устройство стяжек цементных	100м2	3,04	126,2 ч	5	3 дней	Пт 10.06.16	Вт 14.06.16															
48		Устройство подстилающих слоёв песч.	1м3	2,37	8,08 ч	2	1 день	Ср 15.06.16	Ср 15.06.16															
49		Устройство бетонной подготовки	100м3	0,01	2,43 ч	1	1 день	Чт 16.06.16	Чт 16.06.16															
50		Устройство ж/б стен	100м3	0,01	9,77 ч	2	1 день	Пт 17.06.16	Пт 17.06.16															
51		Устройство ж/б лестниц и площадок	100м3	0,07	287,9 ч	4	9 дней	Пн 20.06.16	Чт 30.06.16															
52		Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	0,08	5,12 ч	1	1 день	Пт 01.07.16	Пт 01.07.16															
53		Монтаж колонн	1т	0,07	0,73 ч	2	1 день	Пн 04.07.16	Пн 04.07.16															
54		Монтаж стропильн.и подстроп.ферм	1т	0,19	4,78 ч	2	1 день	Вт 05.07.16	Вт 05.07.16															
55		Устройство металлических ограждений	100м	0,07	3,33 ч	2	1 день	Ср 06.07.16	Ср 06.07.16															
56		Окраска ограждений	100м2	0,36	25,75 ч	2	2 дней	Чт 07.07.16	Пт 08.07.16															
57		Устройство обрешётки из досок	100м2	0,09	2,95 ч	1	1 день	Пн 11.07.16	Пн 11.07.16															
58		Монтаж кровельного покрытия профлист	100м2	0,09	3,3 ч	2	1 день	Вт 12.07.16	Вт 12.07.16															

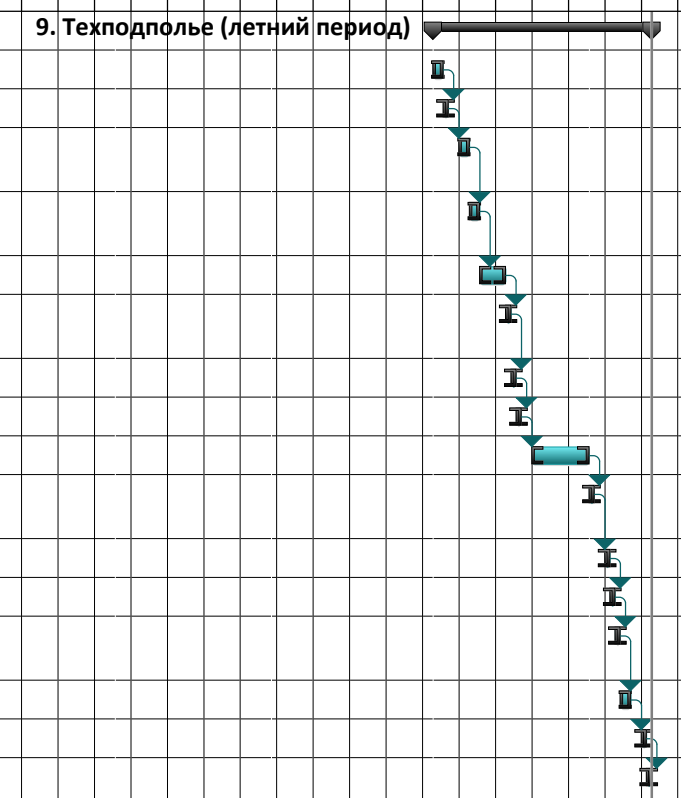

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "РК Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____
Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____
